

PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN T2-T2S

María José García Ravassa

AMISECO ESPAÑA

29/11/22


SISTEMAS DE PAGO



ÍNDICE

1. CALENDARIO GENERAL. PRÓXIMOS HITOS
2. PREPARACIÓN DE LA COMUNIDAD
3. PRUEBAS PREVISTAS Y ACTIVIDADES



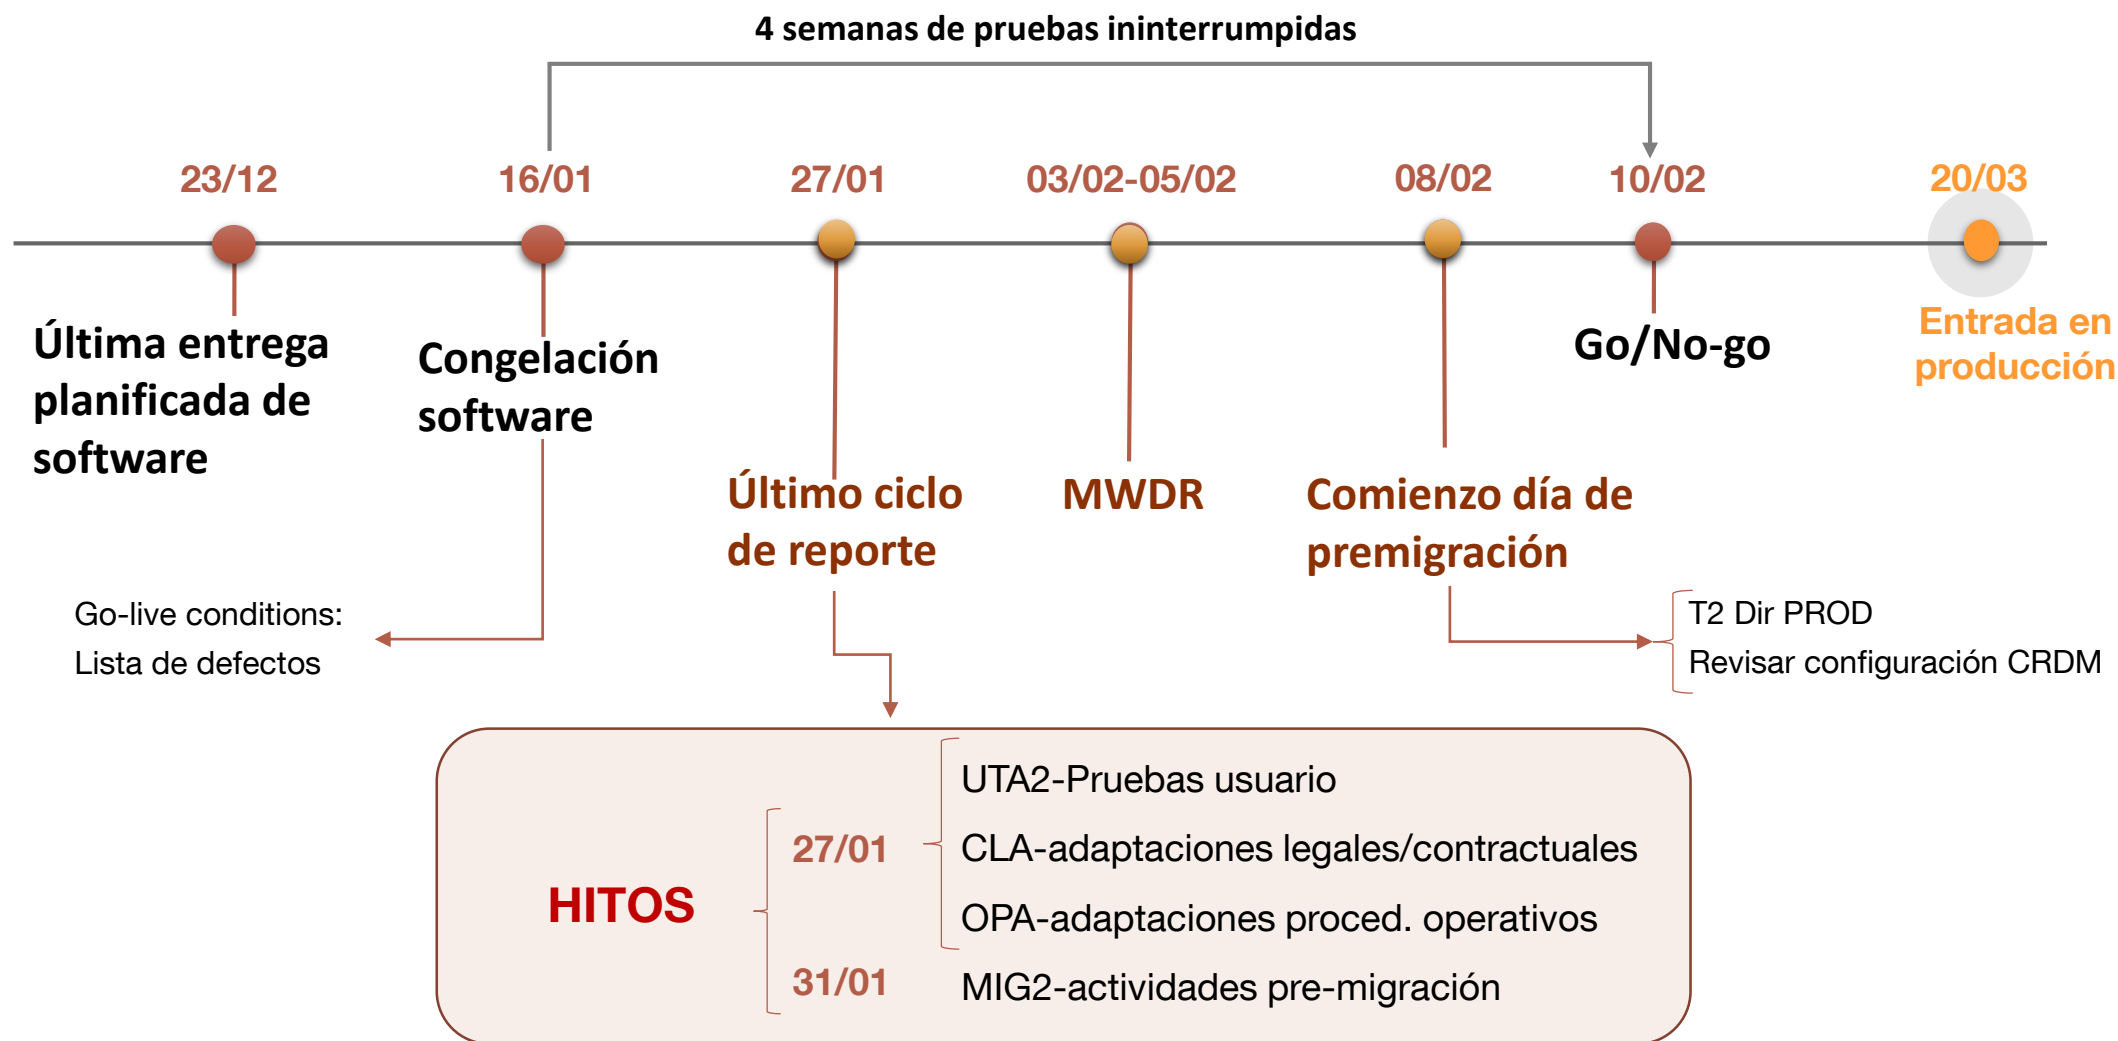

Market readiness report – cut off 30/09/2022 (3/3)

target services		T2-T2S Consolidation Project - Community Readiness Dashboard (version 1.0)																											ECB-PUBLIC
Cut-off date for current reporting cycle:		30/09/2022																											
Cut-off date for previous reporting cycle:		30/06/2022																											
		Fully confident - no risk identified									Risks identified that may endanger migration									No information received									
		Risks identified that can be overcome									Number of CMPs /RMPs having not reported																		
		AT	BE	BG	CY	DE	DK	EE	ES	FI	FR	GR	HR	IE	IT	LT	LU	LV	MT	NL	PL	PT	RO	SI	SK	EU			
Community overall Confidence Level to go-live as reported by the respective CB																													
Change of Confidence Level compared to previous reporting round		↓	↓	↓	↓	↓	↓	→	↓	→	→	→	↑	↓	→	→	→	→	↓	→	→	↓	→	↓	→	↑			
		AT	BE	BG	CY	DE	DK	EE	ES	FI	FR	GR	HR	IE	IT	LT	LU	LV	MT	NL	PL	PT	RO	SI	SK	EU			
CMPs (total # 146) that have reported green/yellow/red/grey - separate row per colour (number/percentages)		Number	1	0	2	4	1	0	3	2	1	2	4	2	1	2	1	0	2	0	2	0	1	2	3	4	5		
		% of CMPs	14%	0%	100%	67%	6%	0%	75%	67%	11%	19%	67%	100%	20%	13%	17%	0%	67%	0%	25%	0%	17%	100%	75%	80%	71%		
		Number	5	4	0	2	11	0	1	4	6	4	2	0	3	8	3	1	1	2	4	2	2	0	1	1	0		
		% of CMPs	71%	67%	0%	33%	69%	0%	25%	67%	64%	36%	33%	0%	60%	50%	50%	100%	33%	67%	50%	50%	33%	0%	25%	20%	0%		
		Number	1	0	0	0	4	1	0	0	1	5	0	0	1	6	0	0	1	2	2	3	0	0	0	0	2		
		% of CMPs	14%	0%	0%	0%	25%	100%	0%	0%	11%	45%	0%	0%	20%	37%	0%	0%	33%	25%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	29%		
RMPs (total # 2,173) that have reported green/yellow/red/grey - separate row per colour (number/percentages)		Number	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		% of RMPs	0%	33%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	11%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
		Number	24	17	13	4	61	9	2	49	7	37	12	12	5	35	5	62	10	0	10	2	14	18	7	18	N/A		
		% of RMPs	32%	25%	68%	67%	5%	60%	33%	51%	50%	15%	63%	60%	38%	45%	36%	49%	71%	0%	18%	15%	44%	90%	54%	56%	N/A		
		Number	28	21	6	2	181	6	1	28	6	115	7	8	7	25	7	49	4	7	26	9	18	0	6	8	N/A		
		% of RMPs	37%	30%	32%	33%	16%	40%	17%	29%	43%	46%	37%	40%	54%	32%	50%	39%	29%	63%	48%	64%	56%	0%	46%	25%	N/A		
		Number	7	8	0	0	892	0	0	3	0	87	0	0	1	4	1	2	0	4	2	3	0	0	0	N/A			
		% of RMPs	9%	12%	0%	0%	77%	0%	0%	3%	0%	35%	0%	0%	8%	5%	7%	2%	0%	37%	4%	21%	0%	0%	0%	N/A			
		Number	17	23	0	0	22	0	3	16	1	10	0	0	0	14	1	13	0	0	16	0	0	2	0	6	N/A		
		% of RMPs	22%	33%	0%	0%	2%	0%	50%	17%	7%	4%	0%	0%	0%	18%	7%	10%	0%	0%	30%	0%	0%	10%	0%	19%	N/A		

Más favorable en España vs situación general

Nivel de confianza deteriorado vs junio/22

Condiciones insuficientes para Go-Live

Evolución previsible positiva s/ valoración pruebas UT octubre


CMPs ES:

-	4	2

RMPs ES:

3	28	49

Estado de las Pruebas de Usuario 31/10/22 - Global

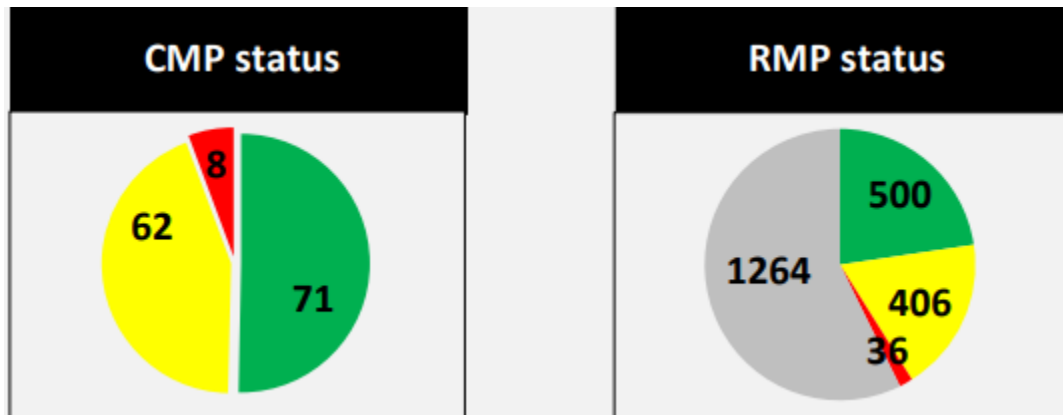


Más favorable en España vs situación general

Tendencia positiva en la valoración vs sep/22

Las condiciones para llevar a cabo las pruebas han mejorado. Los incidentes se resuelven más rápidamente.

Estado de las Pruebas de Usuario 31/10/22 - España

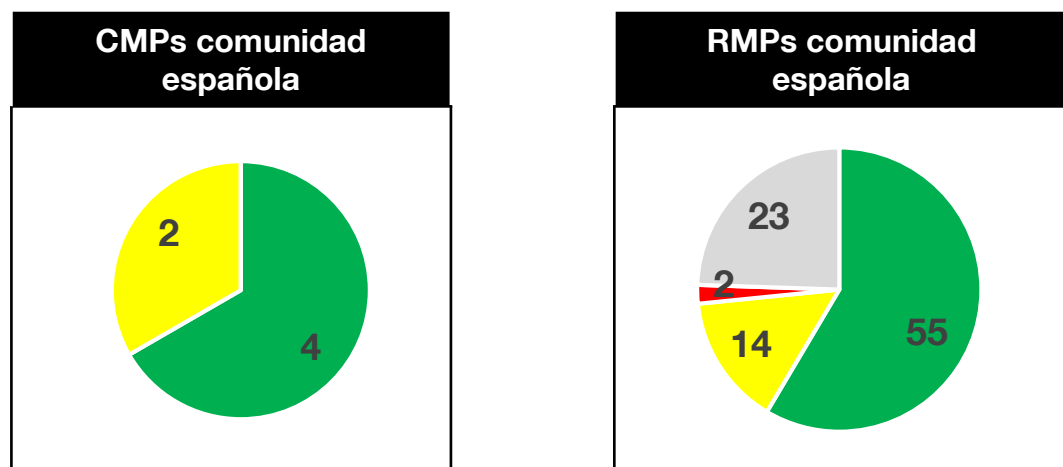

No obstante, también señalan áreas de mejora:

- Estabilidad Inicio/ Fin de día.
- Funcionalidades no entregadas.
 - Campaña de pruebas de Billing en diciembre. DWH ya se puede empezar a testar, con limitaciones.
- Incidencias con Go-Sign Desktop.



Pruebas de facturación

- ✓ 05/12-23/12 (BCs)
- ✓ 02/01-20/01



Pruebas transfronterizas

- ✓ 12/12-16/12
- ✓ 16/01-20/01



Pruebas de comunidad (específica comunidad española)

- ✓ 16/01-20/01 (PDC)



Pruebas de contingencia

- ✓ Diciembre - enero (PDC)



Pruebas con BdE – a petición (Portal REDBDE-Homologación)

- ✓ Abierto desde 26/9/2022



Ensayo de migración febrero 2023

✓ 03/02/2023 – 06/02/2023

Novedades previstas en la migración **marzo 2023**:

- Apertura anticipada (RTS II) el domingo para verificación de configuraciones (pdc)
- Lunes 20/3 festivo Madrid
- Croacia como país del Eurosistema

23/11/2022

REUNIÓN GRUPO TÉCNICO PROYECTO CSLD T2-T2S

- Calendario general
- Situación de la plataforma
- Pruebas y actividades previstas
- Migración
- Registro de datos estáticos y documentación legal

Aplicación Técnica x/2022

Conexión técnica al Banco de España

Aplicación Técnica x/2023. TARGET-Banco de España – Cuentas de efectivo en Banco de España y flujos de liquidez entre las mismas

Aplicación Técnica x/2023. TARGET-Banco de España – Liquidación de órdenes cursadas en relación con la MCA, DCA RTGS, DCA T2S y DCA TIPS

Aplicación Técnica x/2023. TARGET2-Banco de España – Aspectos operativos del procedimiento de contingencia y continuidad operativa



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

