

6ª REUNIÓN AMI-PAY ESPAÑA. GRUPO NACIONAL PARA INFRAESTRUCTURAS DE PAGO

AMI-PAY ESPAÑA. GRUPO NACIONAL PARA INFRAESTRUCTURAS DE PAGO

Madrid

7 de mayo 2020

SISTEMAS DE PAGO





ÍNDICE

- 1. Reporte de AMI-Pay**
- 2. Proyecto consolidación TARGET2/T2S**
- 3. TARGET2**
- 4. Otras cuestiones. Ruegos y preguntas**

ÍNDICE

1. **Reporte de AMI-Pay**
2. **Proyecto consolidación TARGET2/T2S**
3. **TARGET2**
4. **Otras cuestiones. Ruegos y preguntas**

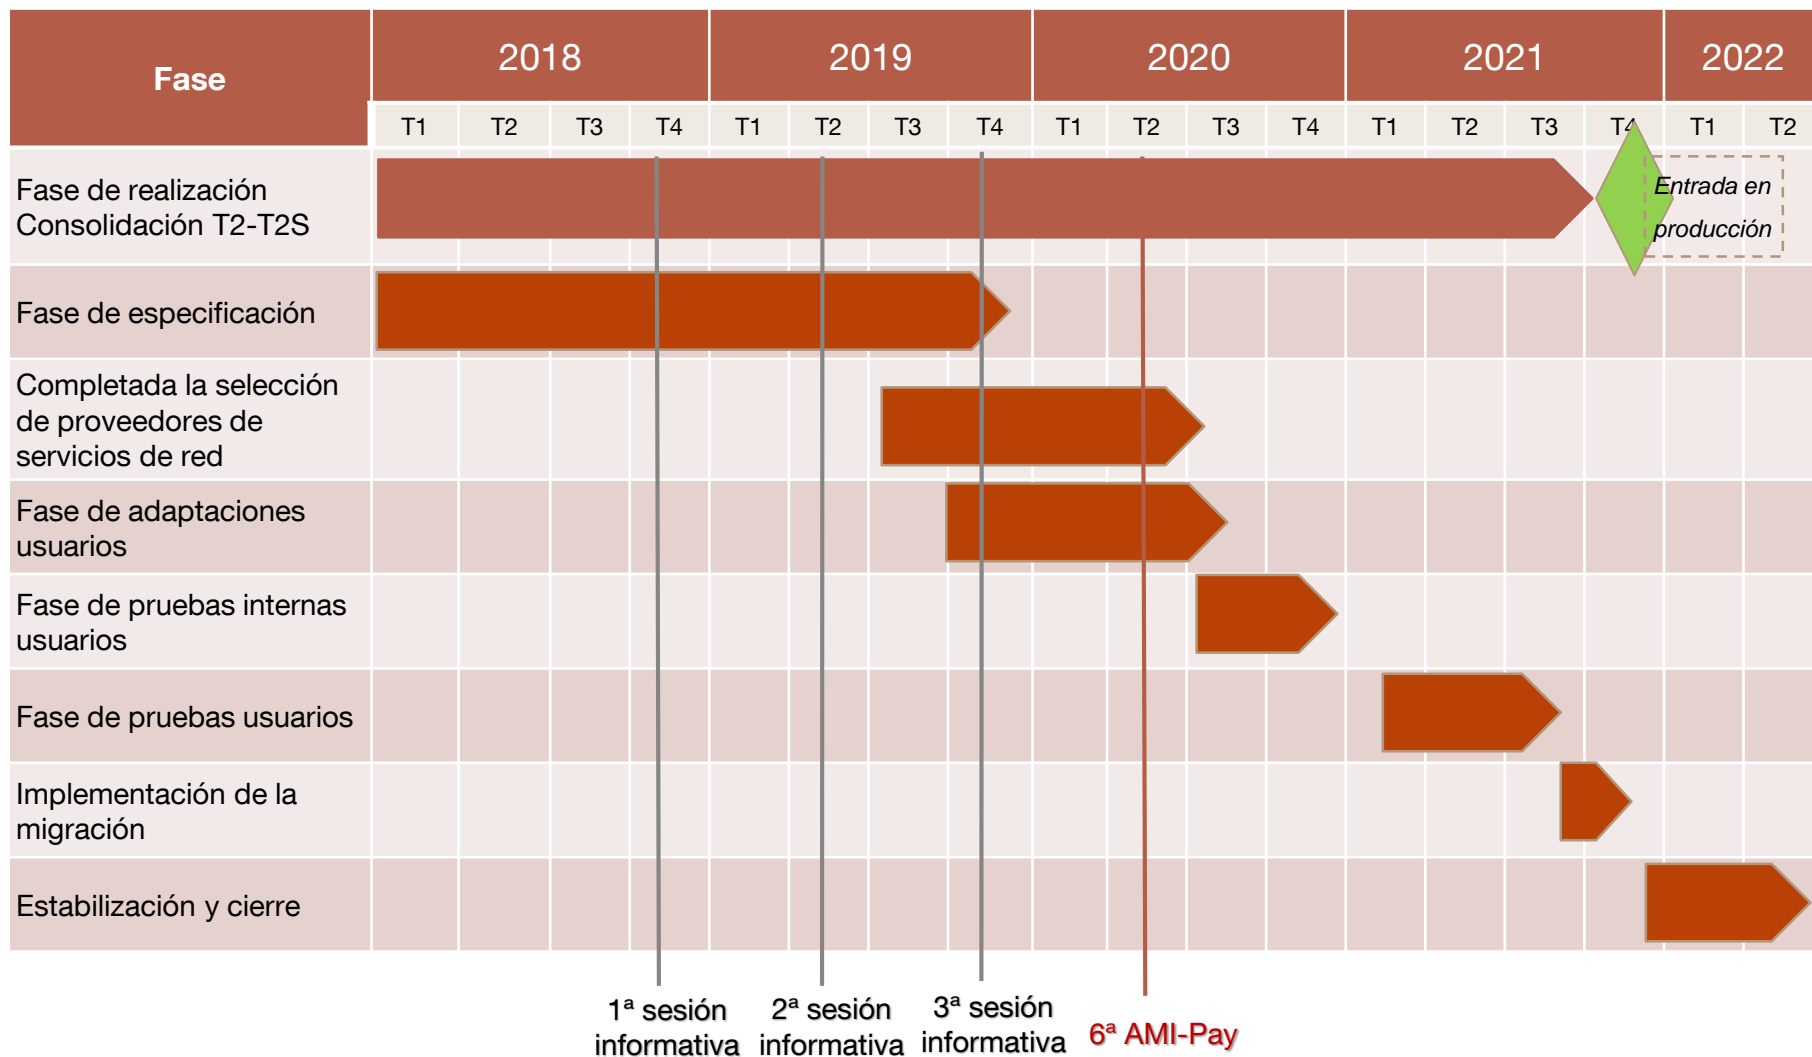

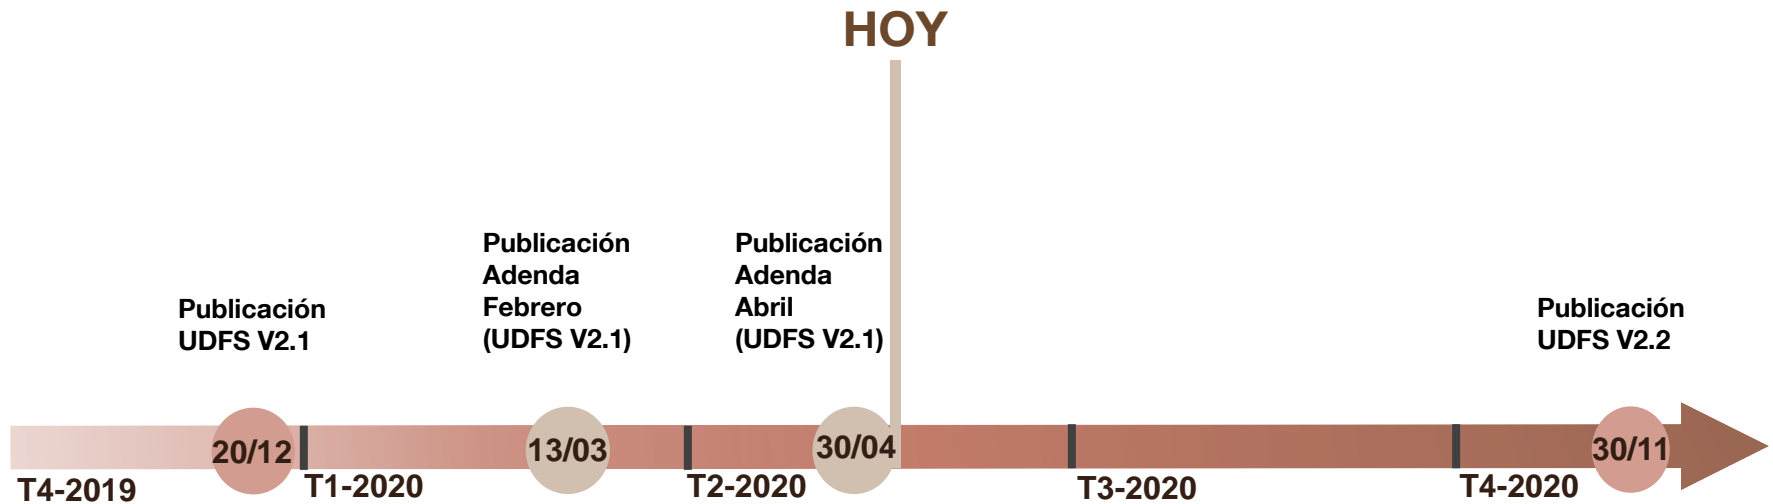

4CB redacción de la V2.2 UDFS



Business Description Document (BDD) V2.1

MyStandards

Tutorial de acceso al CBPR+ Translation Portal para la adaptación de la mensajería cross-border al ISO20022.

T2 Migration, testing and readiness strategy v1.1

Visión general de todos los aspectos a tener en cuenta para asegurar una transición fluida desde el sistema actual TARGET2 al nuevo servicio T2.

FAQ sobre conectividad ESMIG

CLM and RTGS GUI Descriptions v1.0

GUI (Graphical User Interface). Contiene la descripción de las pantallas a desarrollar.

User Hand Book (UHB)

- UHB RTGS y CLM v1.0 - 30.9.2020
- UHB RTGS y CLM v2.0 – antes del comienzo testing BCs y usuarios - 30.11.2020

- UHB CRDM y BDM v1.0 - 31.7.2020
- UHB CRDM y BDM v.2.0 – antes del comienzo testing BCs y usuarios - 18.12.2020

- UHB DWH v 1.0 - 30.9.2020
- UHB DWH v.2.0 – antes del comienzo testing BCs y usuarios - 01.12.2020

Respuesta operativa frente a la pandemia todos actores (entidades, BCE, bancos centrales, 4CB):

- Procedimientos para trabajo en remoto
- Normalidad en servicios de pago prestados
- TARGET2 ha operado con normalidad (*excepto incidente 16 de marzo, fallo técnico no debido a conexión remota*)


Proyecto de consolidación T2/T2S:

- Calendario global se mantiene
- Nueva fecha cumplimiento hito NSP3 (*selección proveedor de servicio de red*): 31 Julio 2020
- Retraso de la migración de SWIFT de los pagos transfronterizos al ISO20022

Los **participantes en AMI-Pay** podrán comentar sobre el impacto del COVID-19 en la prestación de sus servicios, así como el retraso de SWIFT en sus adaptaciones internas para el proyecto de consolidación T2/T2S (puntos 2 y 4 agenda AMI-Pay del 11 de mayo)


Nivel de confianza
de llegar preparado a la
migración en noviembre
2021

Confianza*

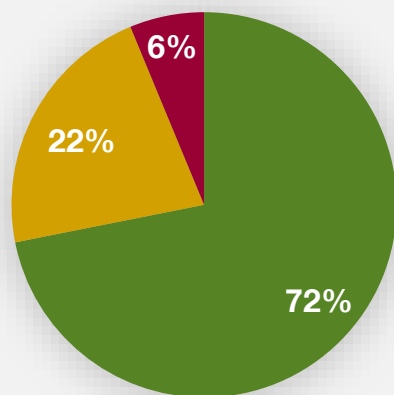


Hito IAD4:
Completada la elaboración
de la documentación de
aplicaciones internas

IAD4

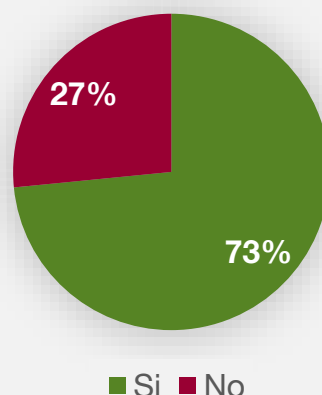

Hito IAD5:
Iniciados los desarrollos
informáticos para las
adaptaciones necesarias a T2

IAD5


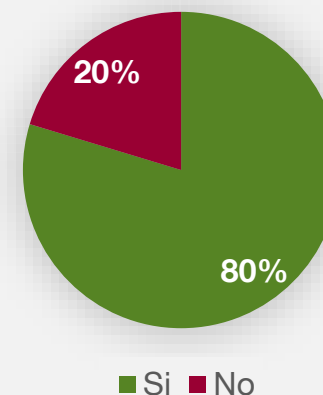


- En cada ciclo de hitos, las entidades revisarán el estado de los hitos pasados.
- Aquellas entidades que cumplieron hitos previos con posterioridad a su vencimiento, enviarán los cuestionarios actualizados de estos hitos en el ciclo vigente.

* Verde: confianza plena, no se identifican riesgos / Amarillo: se identifican riesgos, pero superables / Rojo: se identifican riesgos que pueden hacer peligrar la migración


Nivel de confianza
de llegar preparado
a la migración en
noviembre 2021

Confianza

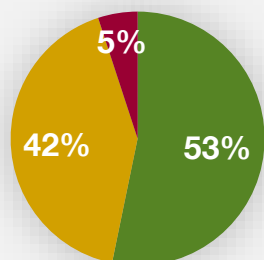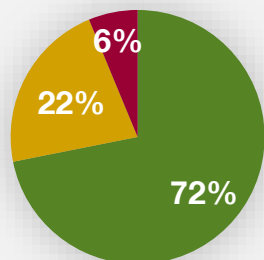


Hito IAD4:
Completada la elaboración
de la documentación de
aplicaciones internas

IAD4




■ Si ■ No




■ Si ■ No

Hito IAD5:
Iniciados los desarrollos
informáticos para las
adap. necesarias a T2

IAD5



■ Si ■ No



■ Si ■ No

Nota: datos Eurosistema sólo incluyen a las entidades más significativas

Recientemente se envió una **consulta a las entidades** que participan en los grupos nacionales de AMI-Pay España y AMI-SeCo España con objeto de conocer la situación de sus adaptaciones a los diferentes proyectos planificados en el ámbito del Eurosistema.

En relación al proyecto de Consolidación T2-T2S casi la totalidad de las entidades mostraron su confianza en cumplir con los hitos programados a partir de abril.

Los **riesgos** que la entidades señalan con un posible impacto en el proyecto son:


- El COVID-19 y la disponibilidad de recursos.
- La decisión de SWIFT de retrasar la migración al ISO20022 para pagos transfronterizos y por tanto la convivencia durante 1 año de ambos estándares.

En cuanto a **las medidas tomadas para mitigar los riesgos**:

- Replanificación, priorización, flexibilidad y mayor seguimiento de los desarrollos, pruebas y soluciones.
- Contemplar el uso del conversor que ofrecerá SWIFT.

- En Marzo, SWIFT anunció el retraso de un año (nov 2022) en la migración a ISO 20022 para pagos transfronterizos.
- SWIFT se ha comprometido en desarrollar cuatro medidas que mitiguen el impacto del retraso en la comunidad bancaria europea.
- Se ha creado el **Eurozone Market Practice Working Group (EMPWG)**, formado por:
 - SWIFT
 - Bancos Europeos
 - 4CB
 - EBA Clearing
 - ECB
- SWIFT publicará próximamente **un plan con el calendario** para cada una de las medidas mitigadoras.

1. El EMPWG definirá las normas que regulen las **prácticas de mercado** para pagos transfronterizos:
 - El objetivo es publicar una guía en MyStandards en Junio 2020.
 - Siguiendo estas normas al emitir pagos en T2 (usando ISO 20022), se garantiza que se **podrá convertir el pago transfronterizo de MX a MT (ISO 15022)** evitando el truncamiento de información.
2. Proporcionar un **software gratuito que valide** que los pagos emitidos a T2 respetan estas normas de uso.
3. Facilitar un **convertor (MX a MT)**, sin coste hasta noviembre 2022, para los bancos intermediarios de un pago transfronterizo originado en T2.
4. Crear un '**Closed User Group**' (**CUG**) a través de SWIFTNet InterAct service al que se podrán unir todas las Entidades que estén preparadas para comunicarse en ISO 20022 antes de noviembre 2022.

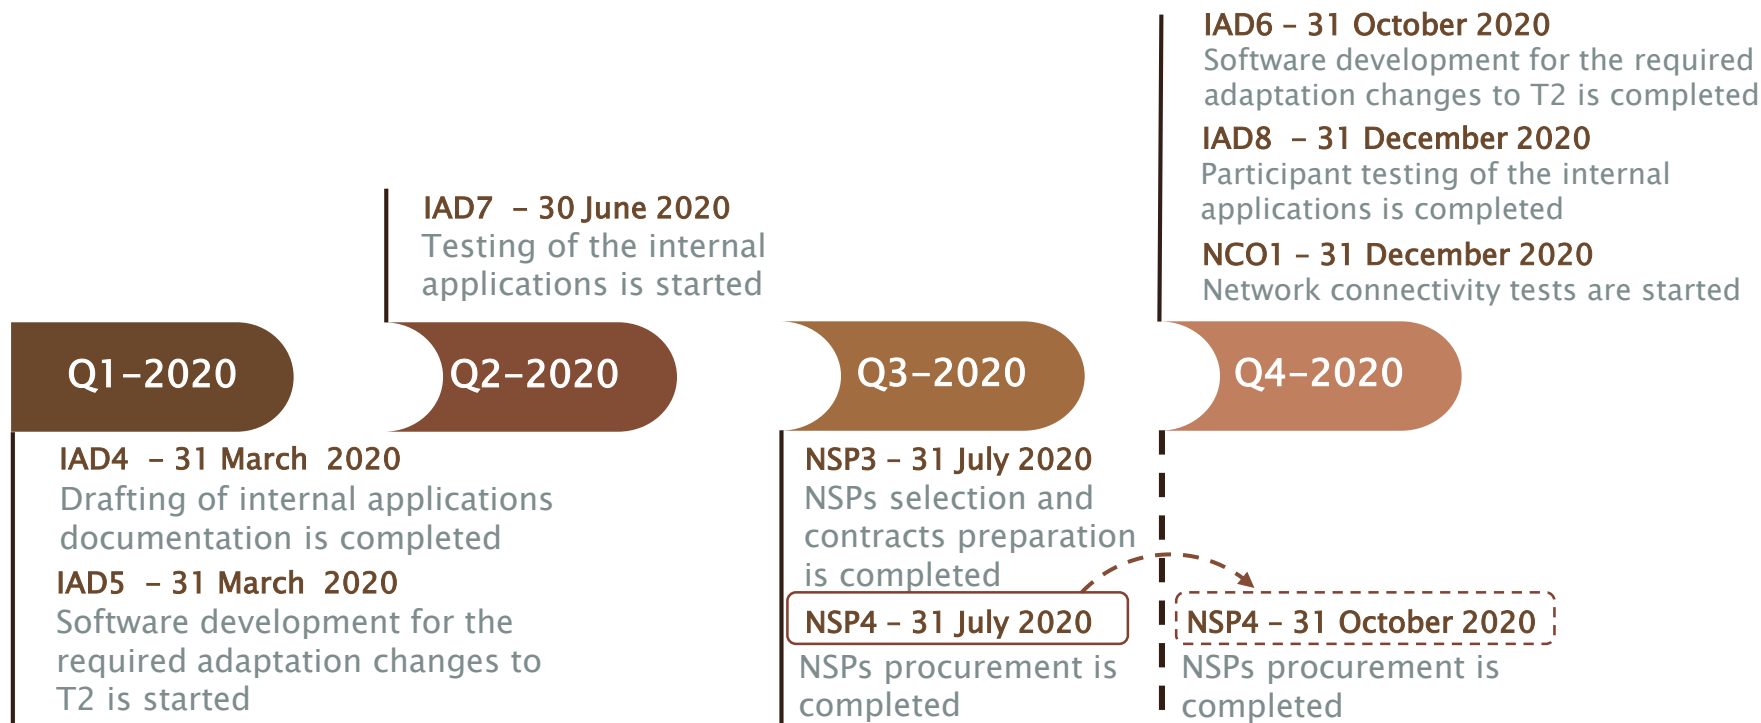

En respuesta a la situación actual de restricción de la movilidad por la pandemia COVID-19, se está valorando retrasar el vencimiento del hito NSP4 al 31/10/20.



Esta decisión parte de un principio básico: no alterar el resto de hitos del proyecto.



¿Cuál es la opinión de los miembros de AMI-Pay España?

- Hay participantes de las infraestructuras del mercado que han mostrado preocupación en diferentes foros (AMI-Pay, AMI-SeCo, T2S CSG) sobre el cumplimiento de las nuevas regulaciones y proyectos que están en marcha.
 - Otros han manifestado que una replanificación también conlleva consumo de recursos, por lo que aquellos que tienen los desarrollos avanzados se verían penalizados.
 - Los participantes consideran necesario analizar todos los proyectos en su conjunto y sus interdependencias, además de cómo afecta una replanificación a todos los actores.
- El Eurosistema planea **lanzar un cuestionario próximamente** para recoger la opinión y contribución del mercado.


ÍNDICE

1. **Reporte de AMI-Pay**
2. **Proyecto consolidación TARGET2/T2S**
3. **TARGET2**
4. **Otras cuestiones. Ruegos y preguntas**


T2 - nro. operaciones total
(media móvil 10 sesiones)




Nro. Operaciones Interbancarias (media móvil 10 sesiones)

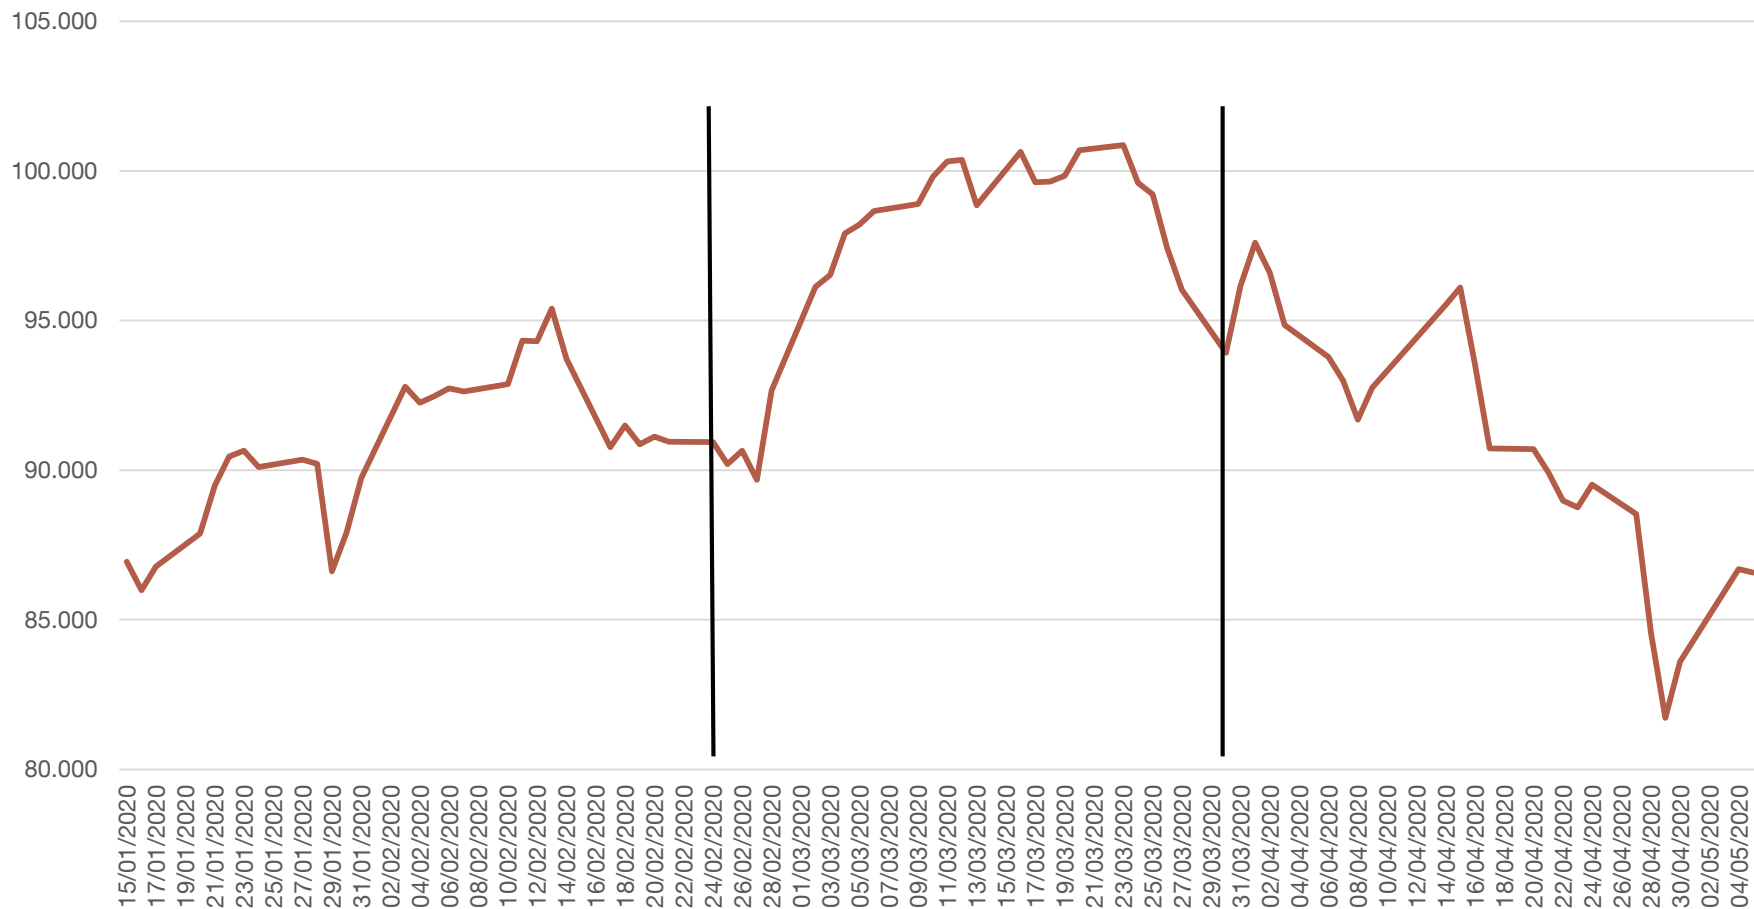

Nro. Operaciones clientes
(media móvil 10 sesiones)

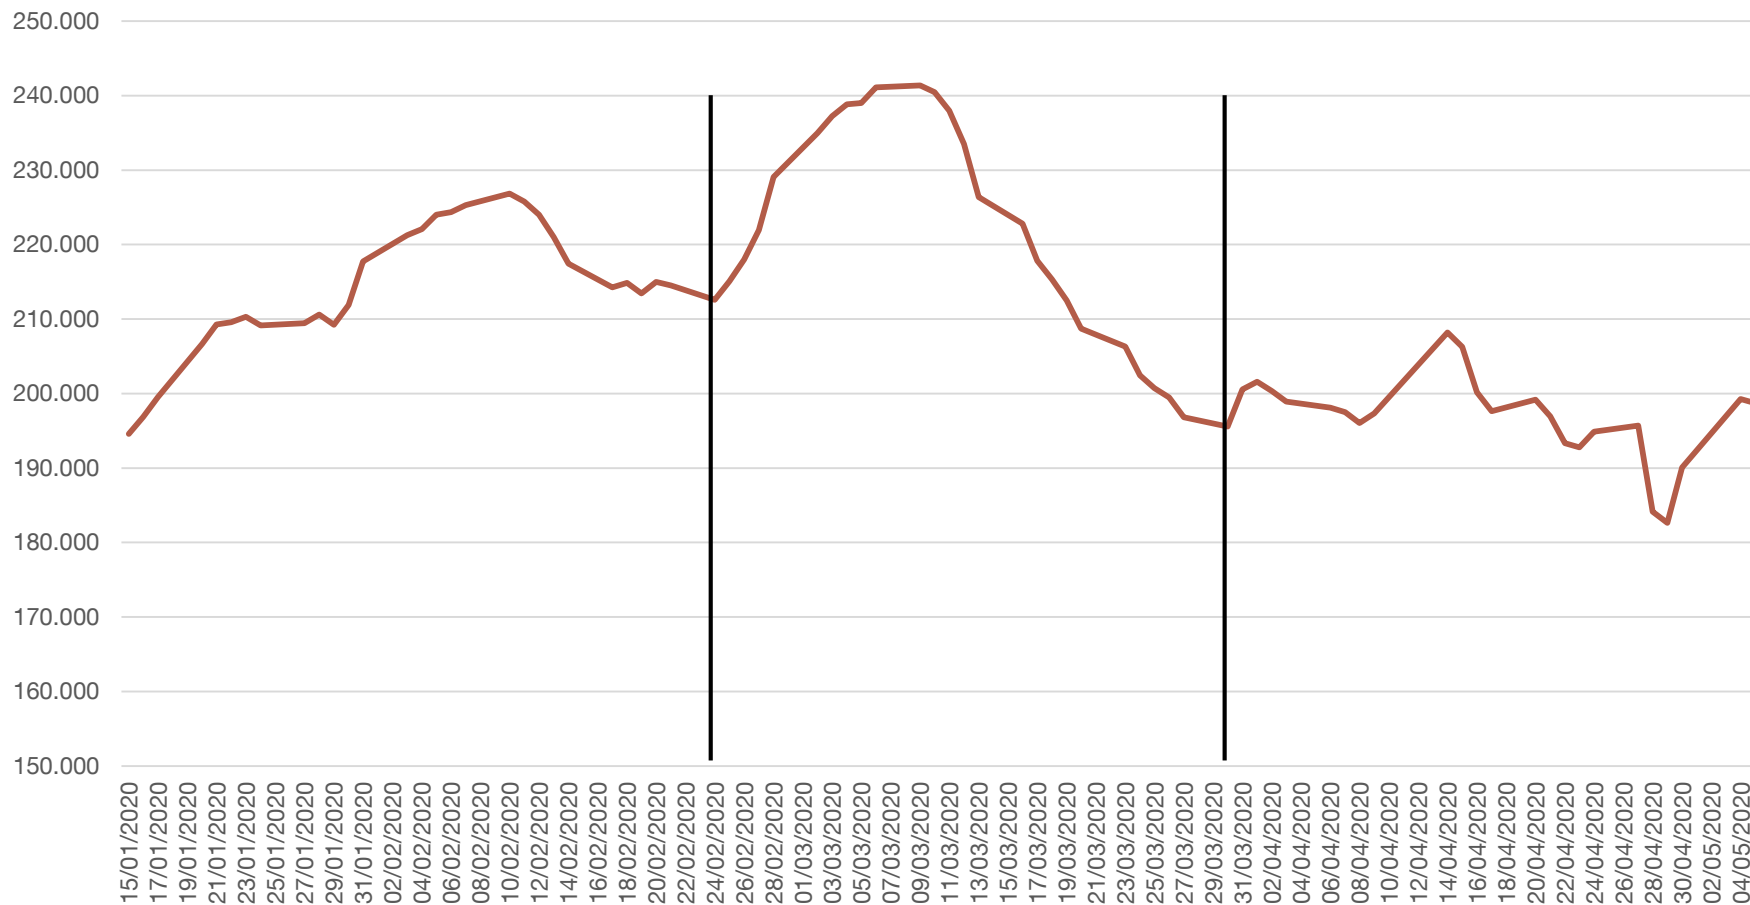

T2S - nro. operaciones total
(media móvil 10 sesiones)

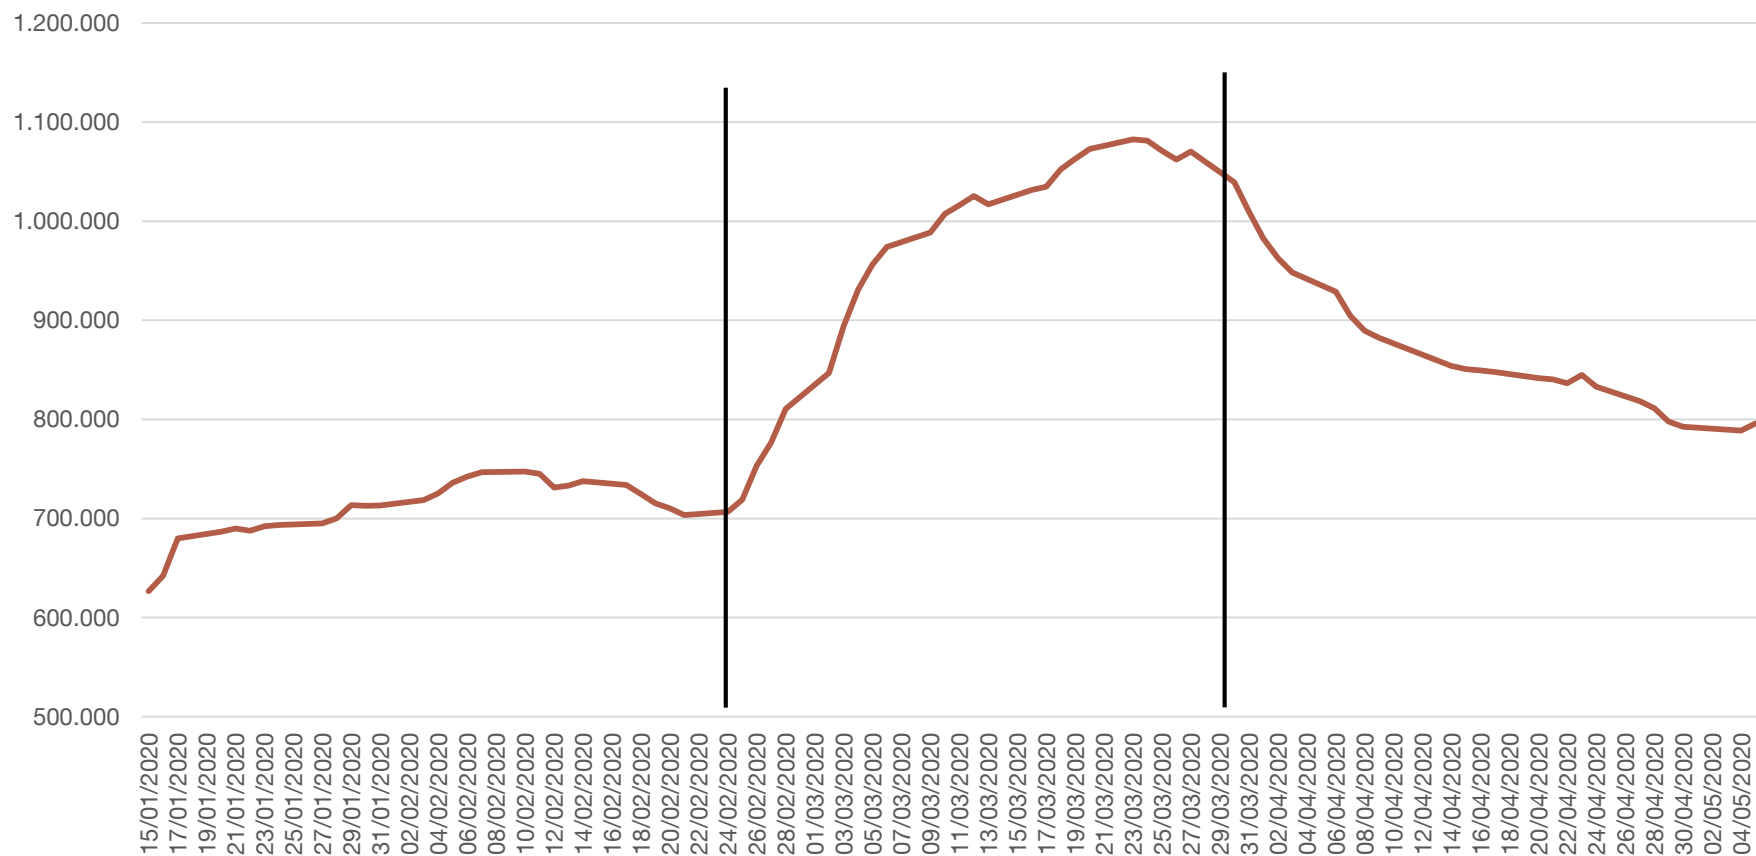

ÍNDICE

1. **Cambios en el grupo**
2. **Proyecto consolidación TARGET2/T2S**
3. **TARGET2**
4. **Otras cuestiones. Ruegos y preguntas**

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

