


- **Criterio recogido en la guía de información para usuarios “infoguide”:**
 - ❖ **entidades de crédito** (tráfico o impacto caída)
 - **primer criterio: tráfico** represente el 1% del volumen total del sistema (media diaria 1T año)
 - **segundo criterio:** impacto de su **caída** supusiese 1'5% tráfico del sistema sin liquidar
 - ❖ **sistemas vinculados** (naturaleza)
 - área pagos minoristas: SIRPS
 - área valores: CSDs, CCPs
 - ❖ **service bureau/ concentrators** (tráfico)
 - Tráfico: 1% del volumen total del sistema
- **Revisión anual**, permanencia dos años en la lista
- **Participantes BdE:** comunicación carta autocertificado

➤ Implicaciones participantes críticos:

- **medidas de continuidad de negocio:** sitio alternativo
- **comunicación de incidentes:** obligación de enviar informe si caídas superiores a 30 min
- **grupo de comunicación de crisis** (novedad):
 - en constitución para TARGET2 (bancos centrales, participantes críticos y proveedores de servicio de red- en caso de incidente de conectividad)
 - se activaría a decisión de los crisis managers (telco ad-hoc), para obtener información específica
 - objetivo: mejorar la comunicación y dar claridad al incidente, pero no gestionará el incidente
 - participación voluntaria

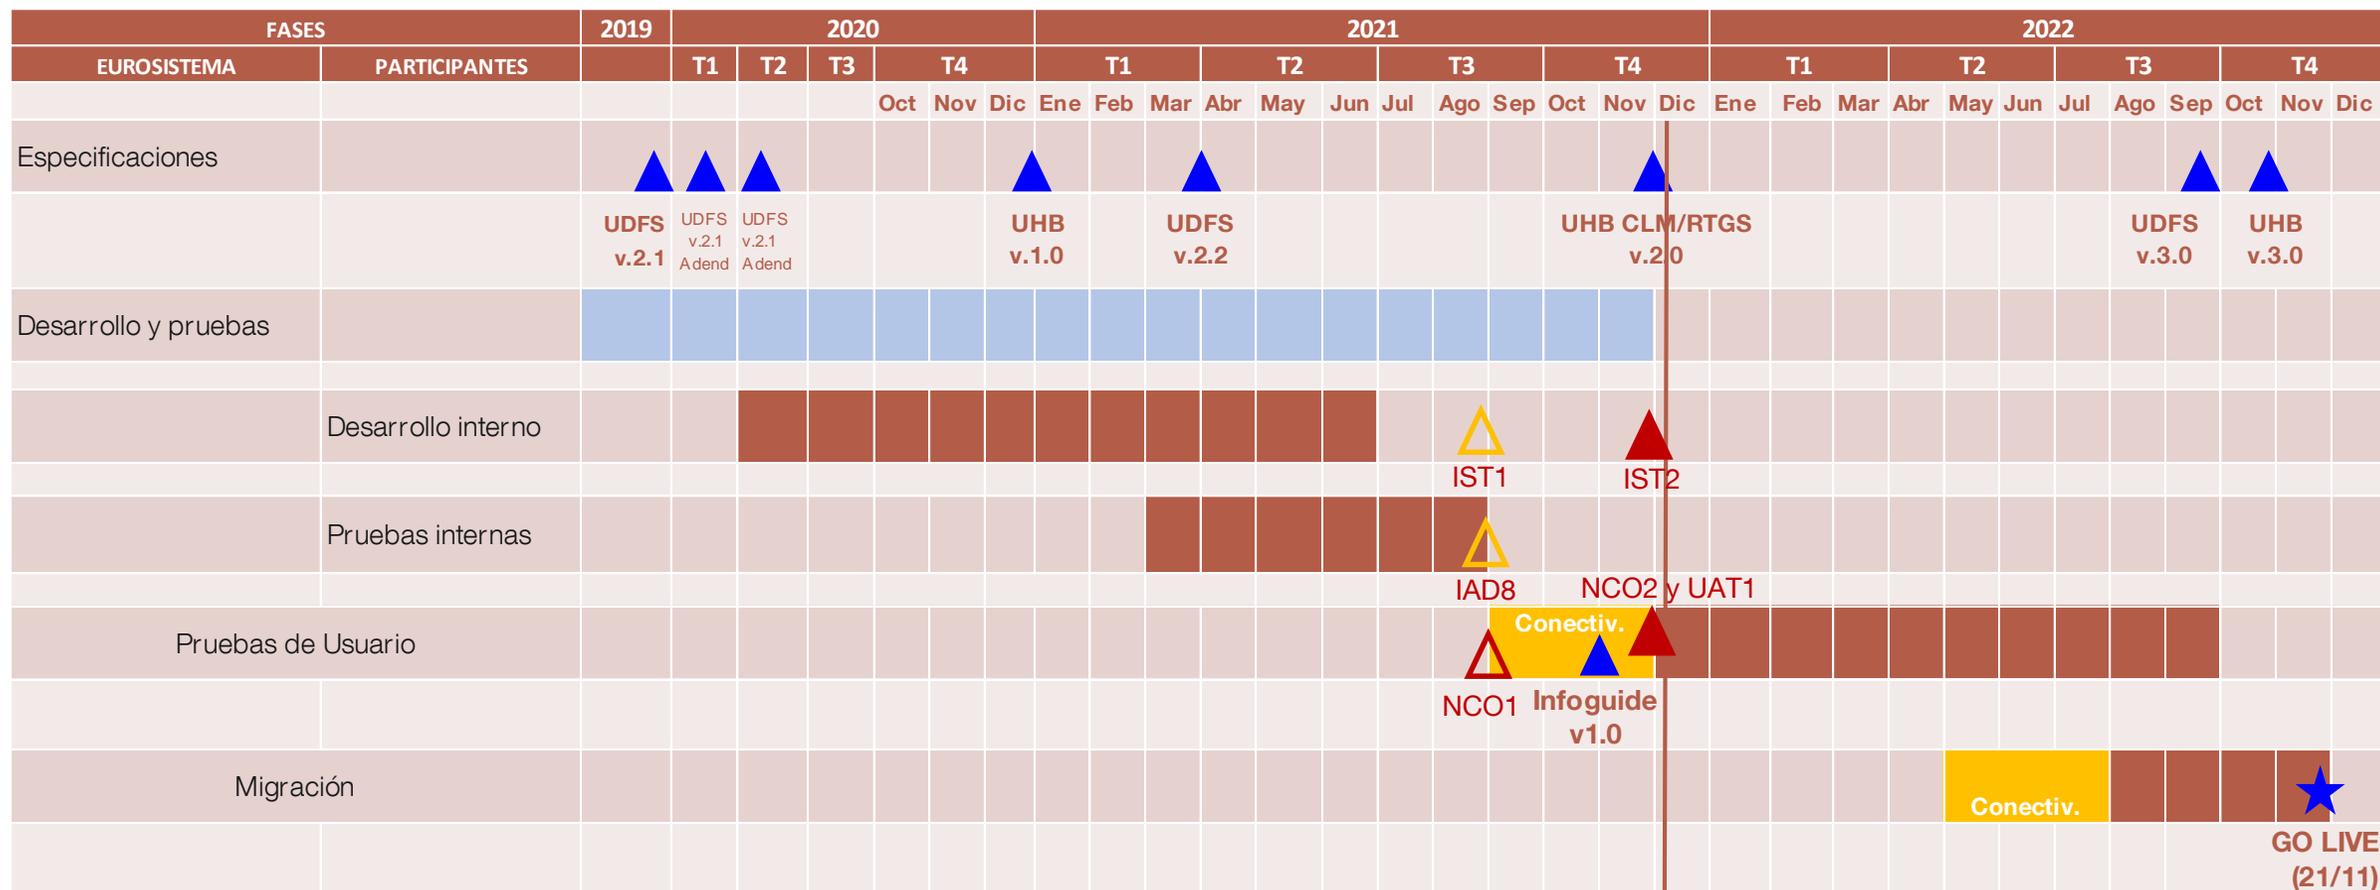


IST1 - Iniciada la formación para las pruebas de usuario
 IST2 - Iniciada la formación para las pruebas de usuario
 IAD8 - Completadas las pruebas de aplicaciones internas

NCO1 - Iniciadas las pruebas de conectividad
 NCO2 - Completadas las pruebas de conectividad
 UAT1 - Iniciadas las pruebas de usuario

AMI-SeCo


Seguimiento de entidades

Proyecto de Consolidación T2/T2S

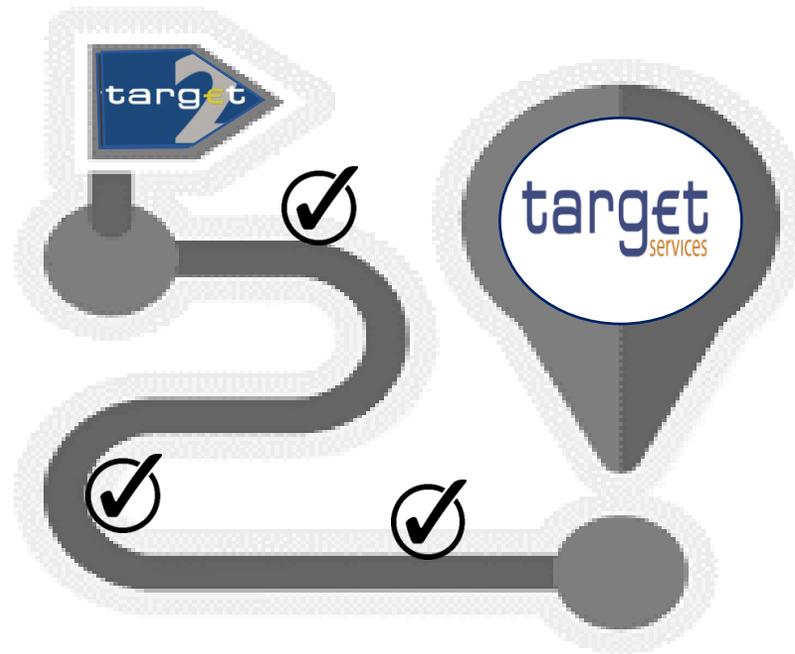


Nivel de confianza
de llegar preparado a la
migración en noviembre
2022

Confianza*

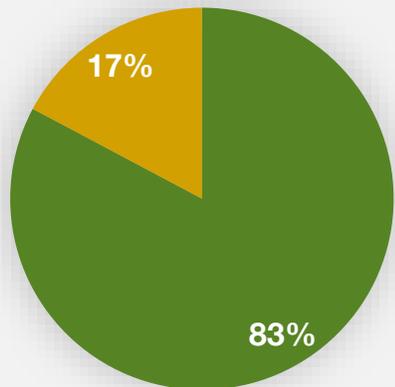

Hito IAD8:
Completadas las pruebas
de aplicaciones internas


IAD8

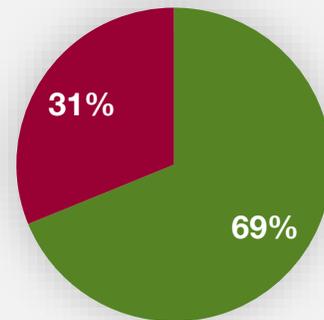

■ Si ■ No

Hito NCO1:
Iniciadas las pruebas de
conectividad de red


NCO1

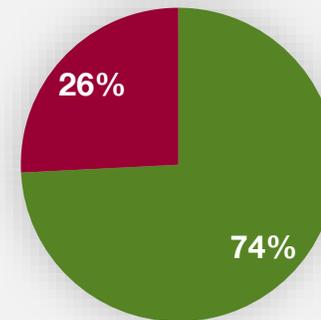

■ Si ■ No

Hito IST1:
Iniciada la formación para
las pruebas de usuario

IST1

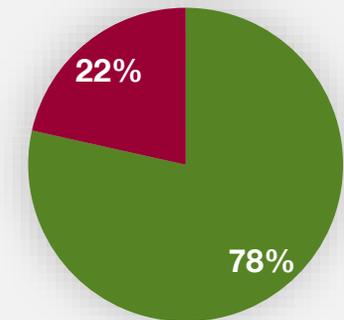

■ Si ■ No

* Verde: confianza plena, no se identifican riesgos / Amarillo: se identifican riesgos, pero superables / Rojo: se identifican riesgos que pueden hacer peligrar la migración

Formación		
IST2	Completada la formación para las pruebas de usuario - Los participantes han completado la formación interna para las pruebas de usuario.	30 noviembre 2021
Conectividad de red		
NCO2	Completadas las pruebas de conectividad de red - Los participantes han completado las pruebas de conectividad en el entorno de pruebas y están preparados para empezar las pruebas de usuario.	30 noviembre 2021
Actividades de pruebas de usuario		
UTA1	Iniciadas las pruebas de usuario - Los participantes inician las pruebas de usuario.	1 diciembre 2021

El participante debe aportar evidencias sobre sus pruebas.

*Estimación, en base a las evidencias recibidas:
40% completado*

Previamente, los participantes habrán entregado a BdE sus formularios de registro. A partir del 01/12/21, BdE empezará a configurar los datos estáticos de los participantes. Posteriormente éstos deberán terminar su propia configuración. Sólo una vez acaba la configuración de los participantes, podrán comenzar la interacción con CLM y RTGS (como pronto el 10/01/22).

*Estimación, en base a las formularios recibidos:
58% completado*



- ✓ Vencimiento ciclo de reporte: 31/12/21
- ✓ Vencimiento hitos: 30/11/21 y 01/12/21
- ✓ Envío cuestionarios: 15-22/12/21
- ✓ Plazo de envío a BdE: 07/01/22

