

REUNIÓN DEL GNU de T2S

MIGRACIÓN A T2S

Madrid, 13 de marzo de 2012

# Indice

---

## ***1. Principales Hitos de la Migración***

## ***2. Fase Preparación de la Migración***

### ***2.1 Objetivos y Líneas generales***

### ***2.2 Grupos de Trabajo y Documentación***

### ***2.3 Distribución de las olas de migración y cronología***


## ***3. Fase Ejecución y Cierre de la Migración***

### ***3.1. Trimestre de Migración***

### ***3.2. Fin de semana de Migración***


## ***4. Temas Pendientes***

# 1.Principales Hitos de La Migración

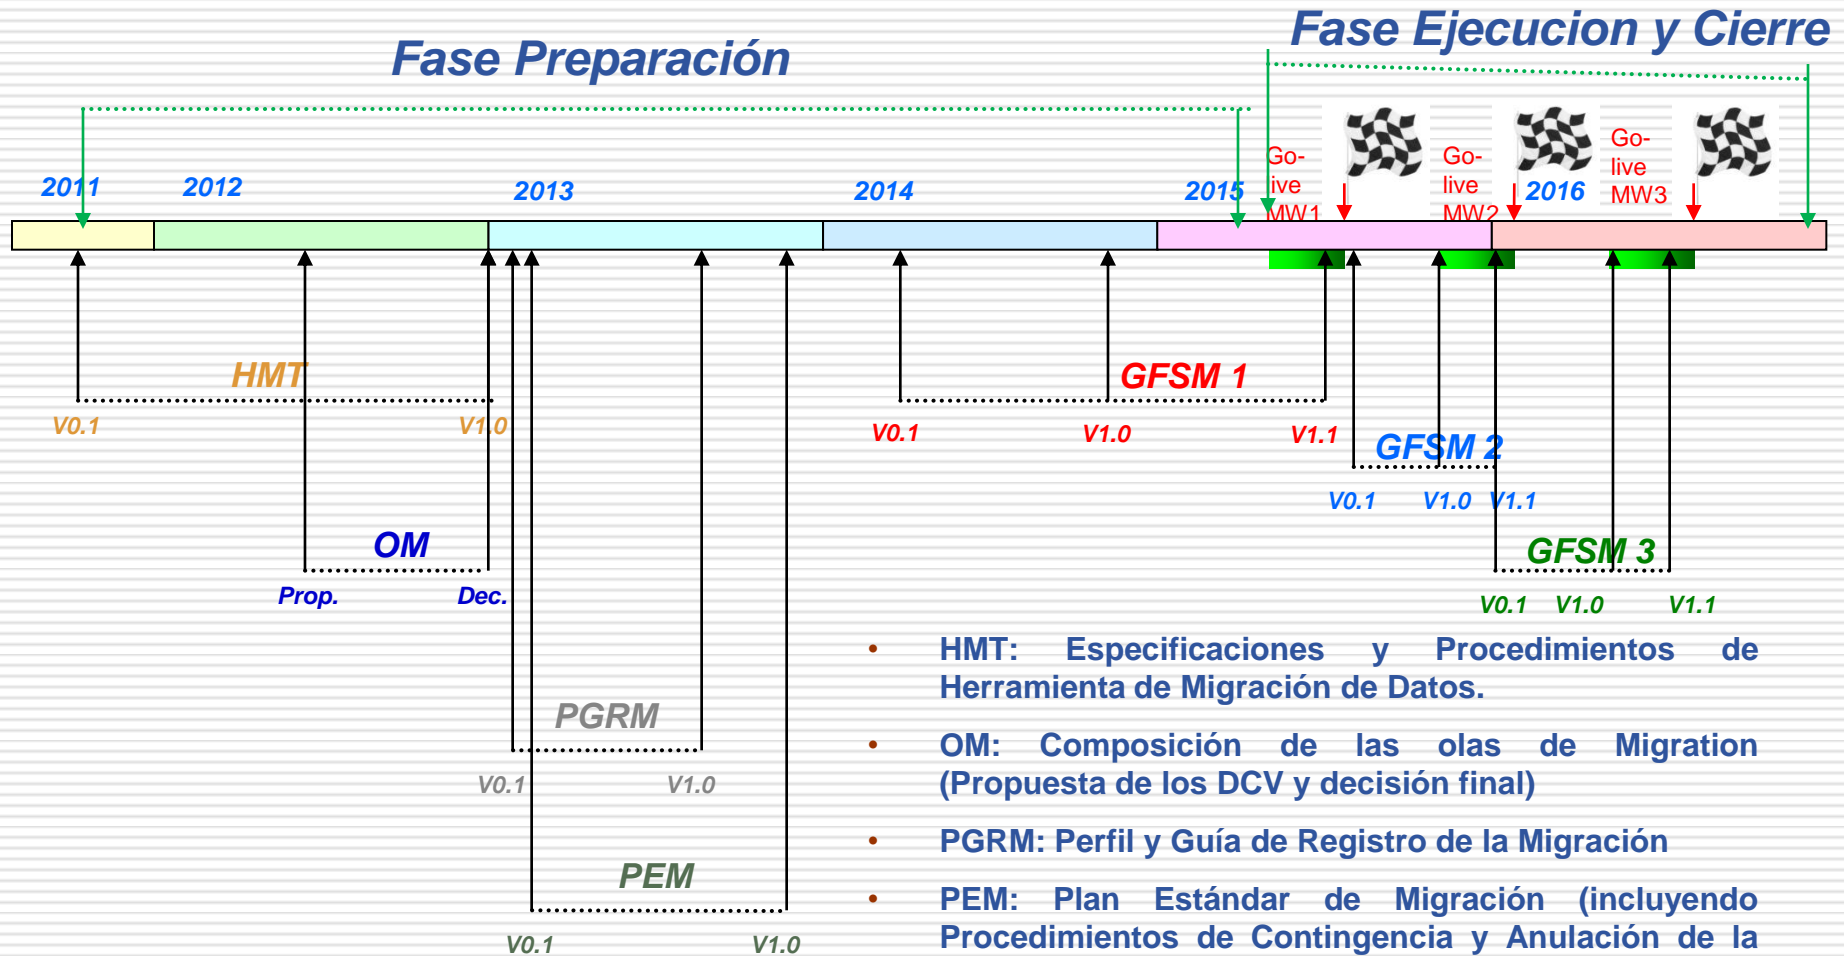

- **HMT:** Especificaciones y Procedimientos de Herramienta de Migración de Datos.
- **OM:** Composición de las olas de Migration (Propuesta de los DCV y decisión final)
- **PGRM:** Perfil y Guía de Registro de la Migración
- **PEM:** Plan Estándar de Migración (incluyendo Procedimientos de Contingencia y Anulación de la Migración )
- **GFSMx:** Guión Fin de Semana de Migración Ola x

## 2.1 Preparación de la Migración: Objetivos y Líneas Generales

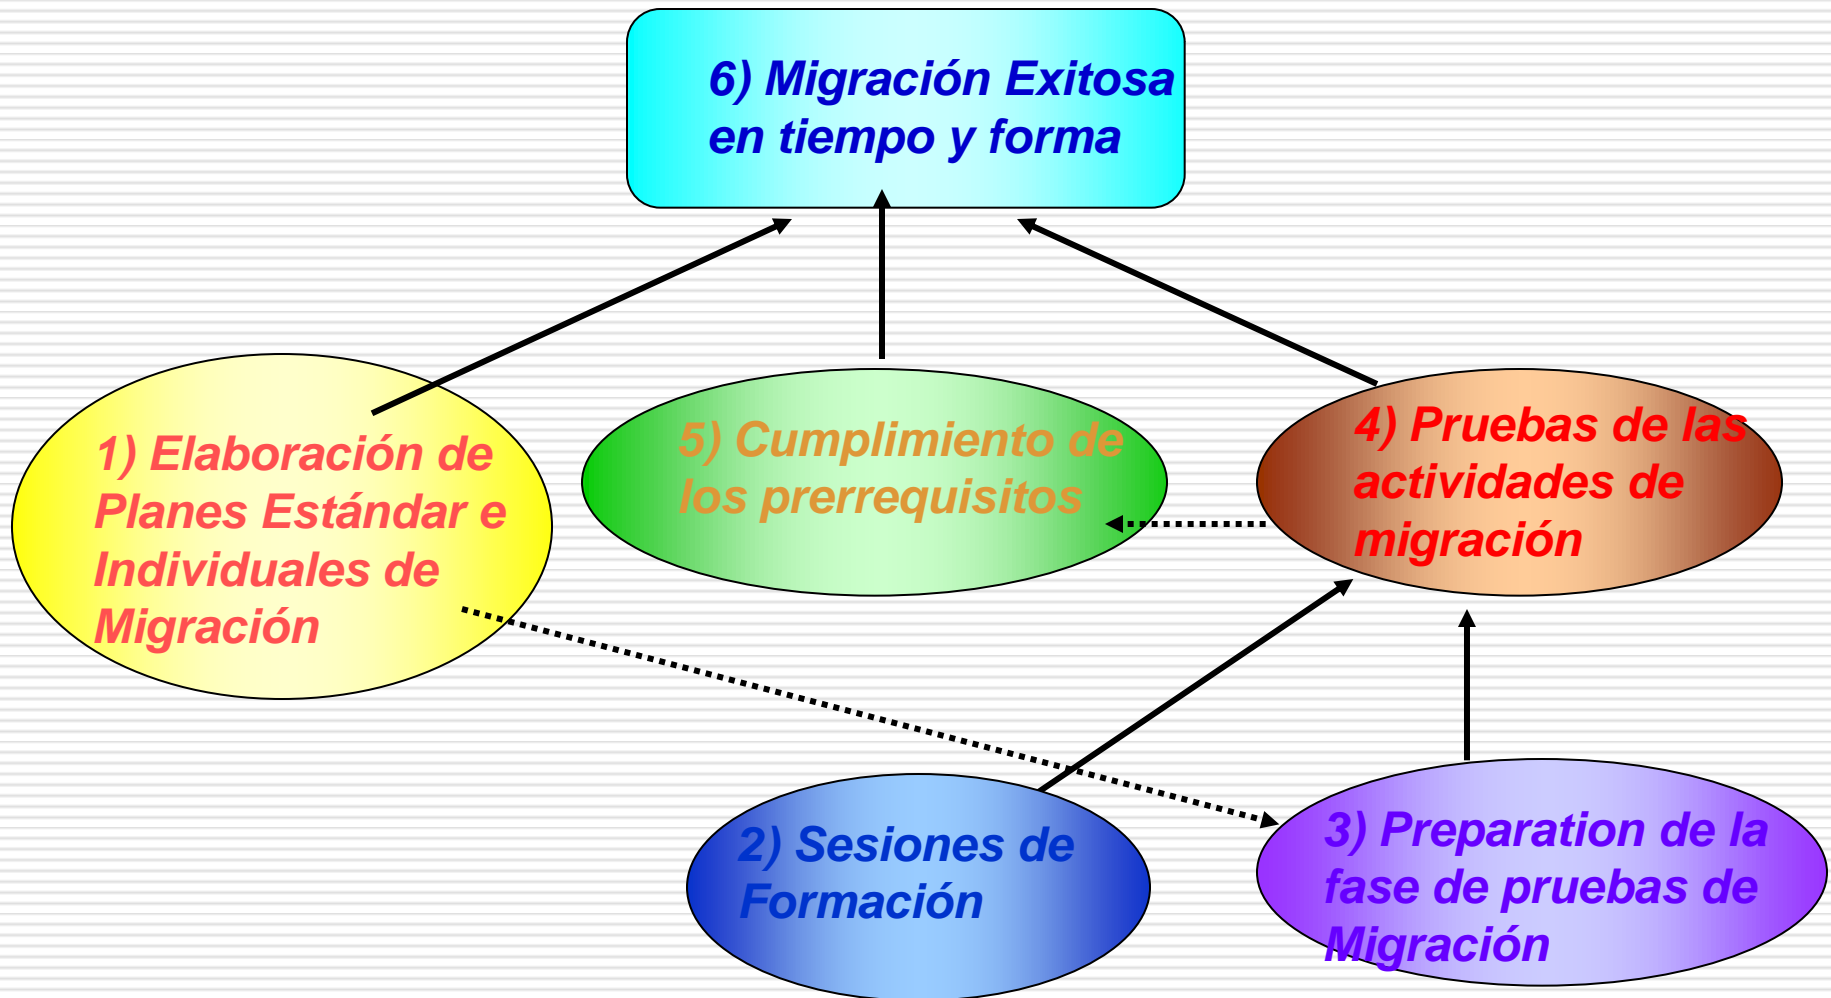

## 2.2 Preparación de la Migración :Documentacion

---

### Plan Estandar de Migración

- Descripción de actividades, plazos y procedimientos para migrar datos a T2S.
- Desde 3 meses antes del fin de semana de la migración hasta el final de la primera semana operativa en T2S.
- Procedimientos de Resolución de incidencias y Anulación de la migración
- Anulación de la migración: posible solo durante la primera semana operativa en T2S, por severos problemas del DCV o degradación del servicio.
- Base para la elaboración de los planes individuales de Migración a preparar por cada CSD.
- *Plazos de Entrega:*
  - *Marzo 2012: Finalización de T2S Plan Básico de Migración*
  - *Febrero 2013: Envío de la versión 0.1 al Grupo de Migración*
  - *Noviembre 2013: Publicación de v1.0 (11 meses antes del comienzo de las pruebas de usuario)*

## 2.2 Preparación de la Migración :Documentacion

### Guión Fin de Semana

Descripción de actividades, plazos, puntos de control, procedimientos de reconciliación y contactos aplicables durante el fin de semana de la migración.

Desde el cierre del último día operacional en los sistemas de los CSDs y los NCBs hasta el cierre de los procesos del primer día de liquidación en T2S.

➤ ***Plazos de Entrega (Ola 1):***

- **Noviembre 2014:** publicación de v1.1.0 (6 meses antes del comienzo de las pruebas de día operativo)
- **Junio 2015:** publicación de v1.1.1 (2 semanas antes del día de lanzamiento de T2S)

➤ ***Plazos de Entrega (Ola 2):***

- **Noviembre 2015:** publicación de v2.1.0 ( comienzo de pruebas de día operativo)
- **Enero 2016:** publicación de v2.1.1 (2 semanas antes del día de lanzamiento de T2S)

➤ ***Plazos de Entrega (Ola 3):***

- **Abril 2016:** publicación de v3.1.0 (2 semanas antes de las pruebas de día operativo)
- **Junio 2016:**publicacion de v3.1.1 (2 semanas antes del lanzamiento de T2S)

## 2.3 Preparación de la Migración: Distribución de las Olas de Migración y Cronología

---

- *Establecimiento de un número máximo de 4 olas de migración, con un periodo mínimo de 3 meses entre cada ola.*
- *Disponibilidad de una ola de contingencia, durante los 6 meses siguientes a la fecha de migración de la ultima ola, sólo en caso de que un CSD no pueda migrar según lo planeado .*
- *18 Junio 2015: Migración de los DCV y BCN de la 1ª ola.*
- *Periodo de Migración estará limitado a 18 meses incluida la ola de contingencia*
- *La Migración no puede tener lugar en periodos críticos ( ej. fin de año)*

## 2.3 Preparación de la Migración: Distribución de las Olas de Migración y Cronología

---

### Cronología:

- Junio 2012: Cada DCV comunica la ola de migración elegida.
- Agosto 2012: Los DCVs entregan propuesta común en conformidad con los criterios acordados de distribución de olas.
- Septiembre-noviembre 2012: Eurosistema y DCVs negocian ajustes en la composición en caso de que la propuesta común no cumpla los criterios
- Diciembre 2012: Decisión final y comunicación de los grupos y fechas de Migración .



# 3. 1 Fase Ejecución y Cierre: Trimestre de Migración de Datos.

---

## Trimestre de Migración de Datos

- SP15 marca el comienzo de la carga de Datos Estáticos durante los 3 meses previos al primer día de funcionamiento de T2S.
- Disponibilidad de Informes y “queries” para comprobar la carga correcta de datos.
- Periodo paralelo a las pruebas de usuario.

## 3. 2 Fase Ejecución y Cierre: Fin de Semana de Migración

---

### Fin de semana de la Migración

- *Migración de Resto de Datos Estáticos.*
- *Migración de Datos Dinámicos.*
- *Confirmación de la carga correcta de datos a través de informes y queries*
- *Puntos de Control de inicio y cierre de fases a lo largo de todo el fin de semana.*
- *Ciclo de liquidación ad-hoc para establecer las posiciones iniciales y las restricciones aplicables .*
- *Después del establecimiento de las posiciones iniciales, ejecución de procesos y ciclos de un día de liquidación estándar de T2S.*

## 4. Temas Pendientes

---

- Carga de Datos Dinámicos:
  - *Migración Gradual*
  - *Migración Fin de Semana*
- Disponibilidad de informes ad-hoc para reconciliación durante el fin de semana de la migración
